




Câmara Municipal de Palmeira

ESTADO DO PARANÁ

 CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA
ESTADO DO PARANÁ
INDICAÇÃO Nº 97/2023
PROTOCOLO Nº 599/2023
DATA: 24/7/2023


mb

propõe A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO no uso de suas atribuições legais

INDICAÇÃO

INDICA ao Poder Legislativo, o arquivamento do Relatório do Departamento Financeiro nº 025/2023 (em anexo).

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Palmeira,
Estado do Paraná, em 20 de julho de 2023.

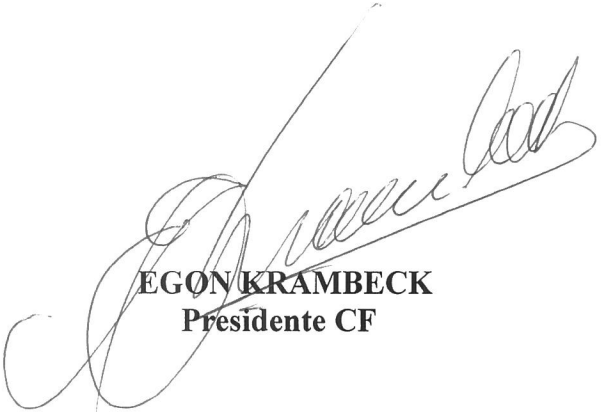

EGON KRAMBECK
Presidente CF



De: SETOR CONTÁBIL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PALMEIRA
Para: ASSESSORIA PARLAMENTAR

Relatório Departamento Financeiro nº 025/2023

Processos Licitatórios, pagamentos e obras até 14/07/2023

O referido relatório de Licitação foi elaborado com base no art. 15, XX da Resolução nº 104/2014. Ressalta-se que o presente relatório e seu anexo contém as informações das licitações, com alguns detalhes e observações pertinente para subsidiar a Comissão de Fiscalização na análise do relatório e emissão de Parecer. A Comissão também pode caso julgue necessário consultar junto a Procuradoria da casa fatores legais referentes a possíveis apontamentos.

Processos Licitatórios:

Pregão – Não houve na semana;

Inexigibilidade – Não houve na semana;

Dispensa 23 a 24 – Sem observações;

Pagamentos

Verificado vários pagamentos por amostragem no período sem indícios de irregularidades;

Obras

Houve alteração nas medições nas obras 01.2023 e 08.2022.

ASSINADO DIGITALMENTE
JOAO ERALDO MARTINS PADILHA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Palmeira, 03/07/2023

Processo	Situação	Abertura	Valor	Objeto	Detalhes
Dispensa 23/23	Em andamento.	11/jul	R\$ 38.272,55	Contratação de empresa especializada para revisão de Máquina Motoniveladora 170 B ano 2023, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.	Sem observações. Ainda não disponível no portal, consultado por meio do sistema de protocolo do executivo
Dispensa 24/23	Em andamento.	12/jul	R\$ 5.200,00	Contratação de empresa especializada na área de Engenharia de Minas, com responsabilidade técnica para adequação de atividades na área de exploração mineral, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.	Sem observações.

Obras:

	Descrição da Intervenção	Empresa	Data Início	Valor Intervenção	Valor Contrato	Valor Aditivo	Situação	Medição até 19/05	Medição até 02/06	Medição até 16/06	Medição até 16/06	Medição até 17/06
07.20 23	execução de obras de ampliação da rede de distribuição de energia elétrica com fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra	ELETRO BRAZ OBRAS ELETRICAS LTDA	31/05/2023	287.665,64	287.665,64		Em Andamento			0,00%	0,00%	
06.20 23	Execução de obras e serviços visando a implantação do Sistema de Monitoramento	IRIS BS SYSTEM EIRELI	15/05/2023	606.811,23	606.811,23		Em Andamento			0,00%	0,00%	
05.20 23	Execução de obras e serviços visando a revitalização da Praça Marechal Floriano Peixoto	HAMMER CONSTRUCCOES E INCORPORACOES LTDA	06/04/2023	942.773,12	942.773,12		Em Andamento			0,00%	0,00%	
04.20 23	execução de obras de ampliação da rede de distribuição de	ELETRO BRAZ OBRAS ELETRICAS EIRELI	05/12/2022	146127,47	146127,47		Em Andamento		89,42%	89,42%	89,42%	

09.20 22	Construção da Estratégia de Saúde da Família de Witmarsum através da Secretaria Municipal de Saúde.	HAMMER CONSTRUÇÃO SE INCORPORAÇÕES LTDA	09/08/2022	41	976.933,41	976.933,41	Em Andamento	35,91%	35,91%	35,91%	35,91%
08.20 22	Contratação de empresa especializada para execução de readequação das coberturas e reformas na Escola Municipal Gabriel Prestes	PONTA FINA COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA	22/11/2022	61	289.388,61	289.388,61	Em Andamento	75,39%	75,39%	75,39%	85,06%
07.20 22	Execução de obras de ampliação do sistema de abastecimento de água nas localidades de Volta Grande e Encruzilhada, neste Município.	J. Dos Santos EPP	02/05/2022	02	918.862,02	918.862,02	Em Andamento	14,05%	14,05%	14,05%	
06.20 22	Execução de obras de instalação de sistema de água na localidade de	J. Dos Santos EPP	04/04/2022	39	773.377,39	773.377,39	Em Andamento	0,00%	0,00%	0,00%	

05.20 22	Faxinal do Silva, neste Município	Contração de empresa especializada para execução de reforço estrutural em salas de aula da Escola Municipal Nossa Senhora do Rocio.	CW PHOINIX CONSTRUTOR A LTDA	25/08/20 22	138.569,57	138.569,57	Em Andamento	63,57 %	75,76 %	75,76 %	
1.202 1	Construção Centro de Eventos.	PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	01/04/20 21	1.745.050,35	<u>1.745.050,35</u>	38.840,73	Em Andamento		91,22 %	91,22 %	
13.20 20	Pavimentação asfáltica - Rua José Antonio Bordignon (Marginal PR-151)	ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	11/08/20 20	4.565.317,73	<u>4.565.317,73</u>	-	Paralisa da		70,27 %	70,27 %	
11.20 19	Reforma e ampliação da Estratégia de Saúde da Família Santa Rosa	D. P. MOREIRA CONSTRUTOR A DE OBRAS - ME	02/10/20 19	257.900,00	<u>257.900,00</u>	111.052,47	Paralisa da		67,47 %	67,47 %	
1.201 8	Pavimentação Rocio II e Vila Rosa	SOTIL LTDA	22/05/20 18	1.052.651,98	<u>1.052.651,98</u>	-	Paralisa da		24,66 %	24,66 %	

1.201 6	Sistema de abastecimento de água	J.DOS SANTOS EPP	05/01/20 16	654.392,31	654.392,31	163.598,07	Paralisa da	91,36 %	91,36 %
9.201 3	QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA	CONSTRUTORA MIKOVSKI LTDA	29/06/20 11	35.661,46	147.118,22	35.661,46	Em Andamento	50,00 %	50,00 %
